

## Obnova Kaplnky Panny Márie Ružencovej

### Postupová správa č. 4

V priebehu mesiaca október 2019 bolo v rámci prác na obnove Kaplnky realizované:

- Finalizácia detailov nových fasádnych omietok, náter fasád systémom KEIM SOLDALIT.
- Nátery okapových plechov na styku strechy prístavby a presbytéria.
- Brúsenie a nátery okien presbytéria a sakristie
- Náter mreží okien presbytéria, náter kamenných ostení lazúrovacím lakom na kameň.
- Repozícia segmentov priečneho ramena a nadstavby vertikály ramena kamenného kríža, reprofilácia povrchu kameňa.
- Demolácia zvetraných betónových chodníkov v areáli kaplnky, nakladanie a vývoz sute.
- Rozobratie žulovej dlažby nádvorja kaplnky, jej deponovanie a areáli
- Realizácia jadrovej a štukovej omietky sokla prístavby, farebné zjednotenie so sokolom presbytéria
- Demontáž lešenia
- Začiatok prác na obnove pôvodných žulových schodov ku Kaplnke

Na základe prehodnotenia harmonogramu prác na obnove Kaplnky sa termín ich ukončenia predpokladáme do 30.11.2019.

Prosíme návštevníkov Lurdskej jaskynky pri Kaplnke o zvýšenú opatrnosť a dodržiavanie prípadných pokynov pracovníkov stavby.

*V Dúbravke 31.10.2019*

Obnova Kaplnky Panny Márie Ružencovej



Nový farebný šat fasád kaplnky

Obnova Kaplnky Panny Márie Ružencovej




Obnovené kamenné ostenia, mreže a okná.

## Obnova Kaplnky Panny Márie Ružencovej



Reprofilácia tvarov pôvodného kríža pred kaplnkou

Obnova Kaplnky Panny Márie Ružencovej

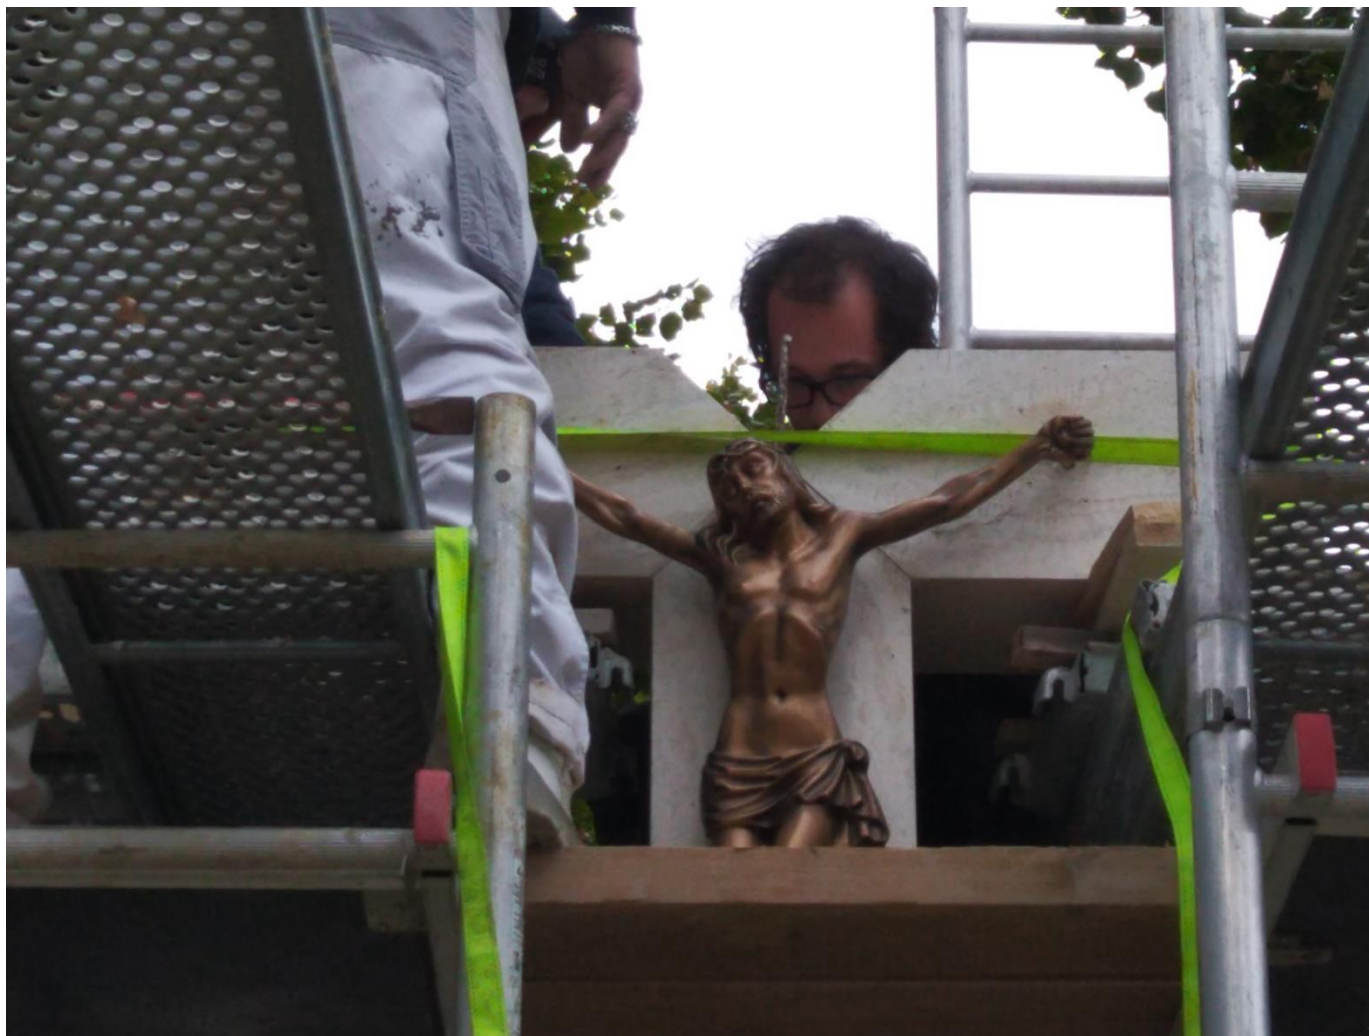

Ramená kríža museli byť nanovo lepené

## Obnova Kaplnky Panny Márie Ružencovej



Kríž pred finalizáciou štruktúry povrchu a náterom

## Obnova Kaplnky Panny Márie Ružencovej



Nádvorie Kaplnky bez rozobranej pôvodnej dlažby

Obnova Kaplnky Panny Márie Ružencovej



Čistenie medzier segmentov schodišťa pred ich špárovaním maltou
